

Inbetriebnahme/Einregulierung freeAir 100e

Kunde/Bauvorhaben: _____

Einbauort: _____

Anschluss Zweitraum: _____

Kein ☐ Abluft ☐ **nur** Abluft ☐ Zuluft ☐ Abluft/Zuluft ☐

Seriennummer Softwareversion

Wärmetauscher: Aluminium (HHV) ☐ Enthalpie (ERV) ☐

Einbauvariante auf Typenschild angekreuzt:

Dezentral ☐ -D Zentral ☐ -Z

Abluftleitungen (z.B. 2x Ø75mm mit 5 m Länge): _____

zu versorgende Raumfläche m²

Erhöhte Mindestlüftung: DIP-Schaltereinstellung:

1 2

☐ ☐

☐ ☐

1 2 3 4 5 6 7 8

On ☐☐☐☐☐☐☐☐

Off ☐☐☐☐☐☐☐☐

End-Drehzahl Abluft bei 20 m³/h U/min (max. 1100)

End-Drehzahl Zuluft bei 20 m³/h U/min (max. 1100)

End-Drehzahl Abluft bei 100 m³/h U/min (max. 2750)

End-Drehzahl Zuluft bei 100 m³/h U/min (max. 2800)

Luftströmung Voll geöffnete Ventile/ ohne Ventilfilter ☐ ja ☐ nein Ø Ventil (min. 125mm)

Überströmung Türunterschnitt überprüft ☐ ja ☐ nein min. 7mm (100m³/h => 10mm)

Betrieb Störungsfrei (nach 10 Min) ☐ ja ☐ nein

Kunde Eingewiesen/Betriebsanleitung übergeben ☐ ja ☐ nein


Das freeAir 100 Lüftungssystem passt die Lüfterdrehzahl bedarfsgeführt und automatisch an die Filter- und Rohrleitungswiderstände an.

Eine weitere Einregulierung der Anlage ist nur erforderlich, im Falle mehrerer Ventile an einem freeAir100 System, bei dem die Leitungen in der Länge variieren.

WLAN-Anbindung: (nach aktivierter WLAN-Funktion mit Passwort möglich)

-> freeAir-Connect/Minuten-Werte/RSSI (Wert -60dBm bis -80dBm)

Kunde wünscht Wartungsvertrag ☐ ja ☐ nein

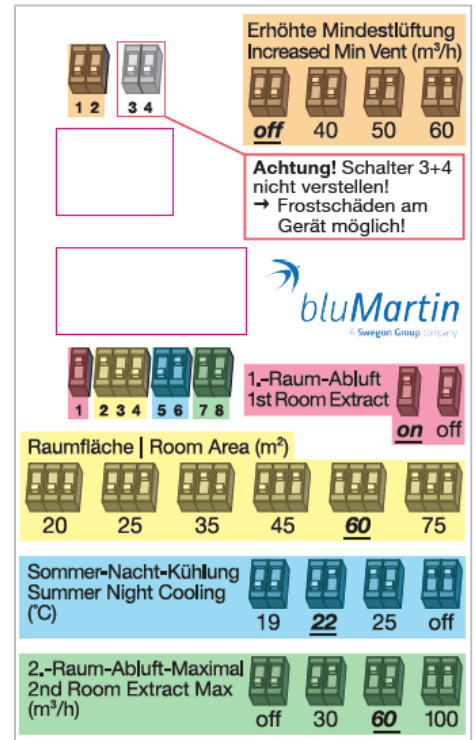

Erhöhte Mindestlüftung
Increased Min Vent (m³/h)
off 40 50 60

Achtung! Schalter 3+4 nicht verstellen!
→ Frostschäden am Gerät möglich!

1.-Raum-Abluft
1st Room Extract
on off

Raumfläche | Room Area (m²)
20 25 35 45 60 75

Sommer-Nacht-Kühlung
Summer Night Cooling (°C)
19 22 25 off

2.-Raum-Abluft-Maximal
2nd Room Extract Max (m³/h)
off 30 60 100

Datum/Ort _____

Firma _____

Name _____
